

VILLE DE
pully

**Réaménagement de la rue de la Poste et de
l'av. Samson Reymondin
Travaux connexes (centre-ville et sentier du Lycée)
Séance d'information aux commerçants**


Direction des travaux et des services industriels

Mercredi 10 mars 2021



Programme de la séance

- **Accueil, introduction,**
M. Marc Zolliker, Conseiller municipal, Directeur de la Direction des travaux et des services industriels (DTSI)
M. Nicolas Leuba, Conseiller municipal, Directeur de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement (DUE)
- **Réaménagement de l'espace public**
M. Nicolas Leuba
- **Renouvellement des infrastructures**
M. Régis Brasey, chef de projet à la DTSI, responsable du projet/chantier
- **Organisation du chantier**
M. Marc Zolliker
 - Planning et phasage
 - Circulation et stationnement
- **Conclusion**
- **Discussion / questions**

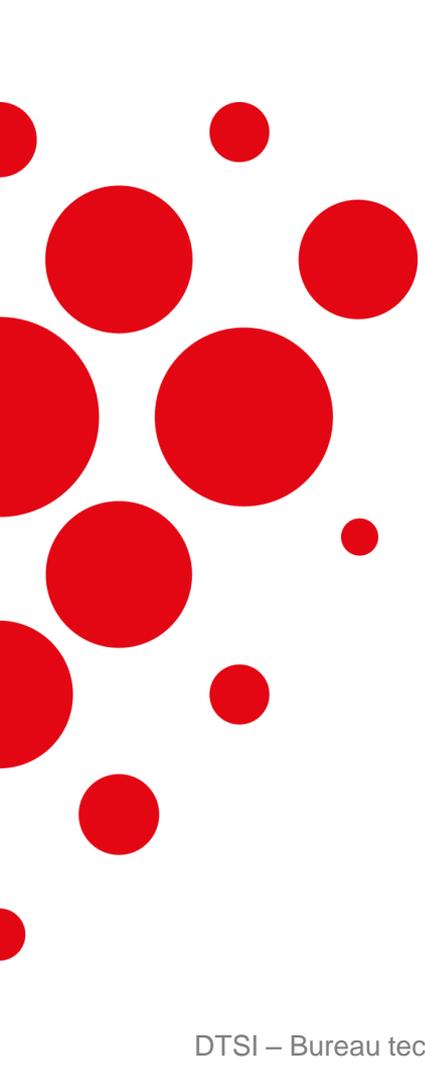

Personnes-clés du chantier

- **M. Régis Brasey**, chef de projet, direction des travaux, aménagements routiers et renouvellement des infrastructures, DTSI
- **M. Francesc Clarena**, direction des travaux, aménagements urbains et paysagers, Direction de l'urbanisme et de l'environnement, DUE
- **Police Est Lausannois**, signalisation et déviation de la circulation
- **M. Jetmir Alim**, directeur, entreprise FFA SA, pilote du consortium FFA SA - AGV Toni SA
- **M. Charles Cardinaux**, technicien, entreprise AGV Toni SA (secteur rue de la Poste)
- **M. Artan Alim**, technicien, entreprise FFA SA (secteur av. Samson Reymondin et sentier du Lycée)




Historique et avancement du projet

- ✓ Octobre 2015 Lancement d'une démarche participative sur le réaménagement du centre-ville.
- ✓ Février 2017 Fin de la démarche participative.
- ✓ Septembre 2018 Séance publique d'information présentant le nouveau schéma de circulation du centre ainsi que les avant-projets de réaménagement de la rue de la Poste et de l'av. de Lavaux.
- ✓ Novembre 2018 Séance de présentation de l'avant-projet de réaménagement de la rue de la Poste dédiée aux commerçants du centre-ville.
- ✓ Février 2019 Examen préalable du projet par le Canton.
- ✓ Novembre 2019 Enquête publique.
- ✓ Novembre 2020 Acceptation du préavis N° 11-2020 par le Conseil communal et demande de permis de construire auprès du Canton.
- ✓ Mars 2021 Délivrance du permis de construire.




Périmètre d'action du projet

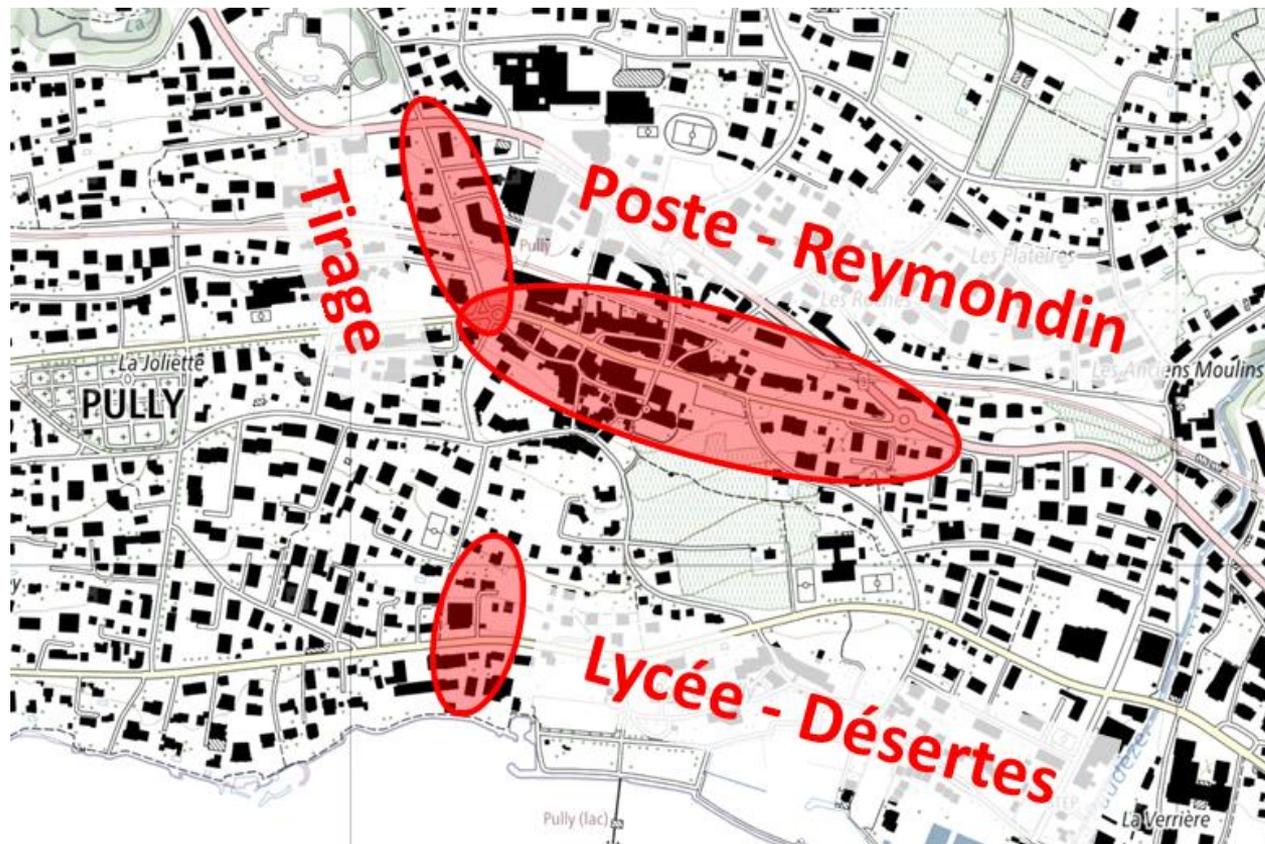



Réaménagement de l'espace public

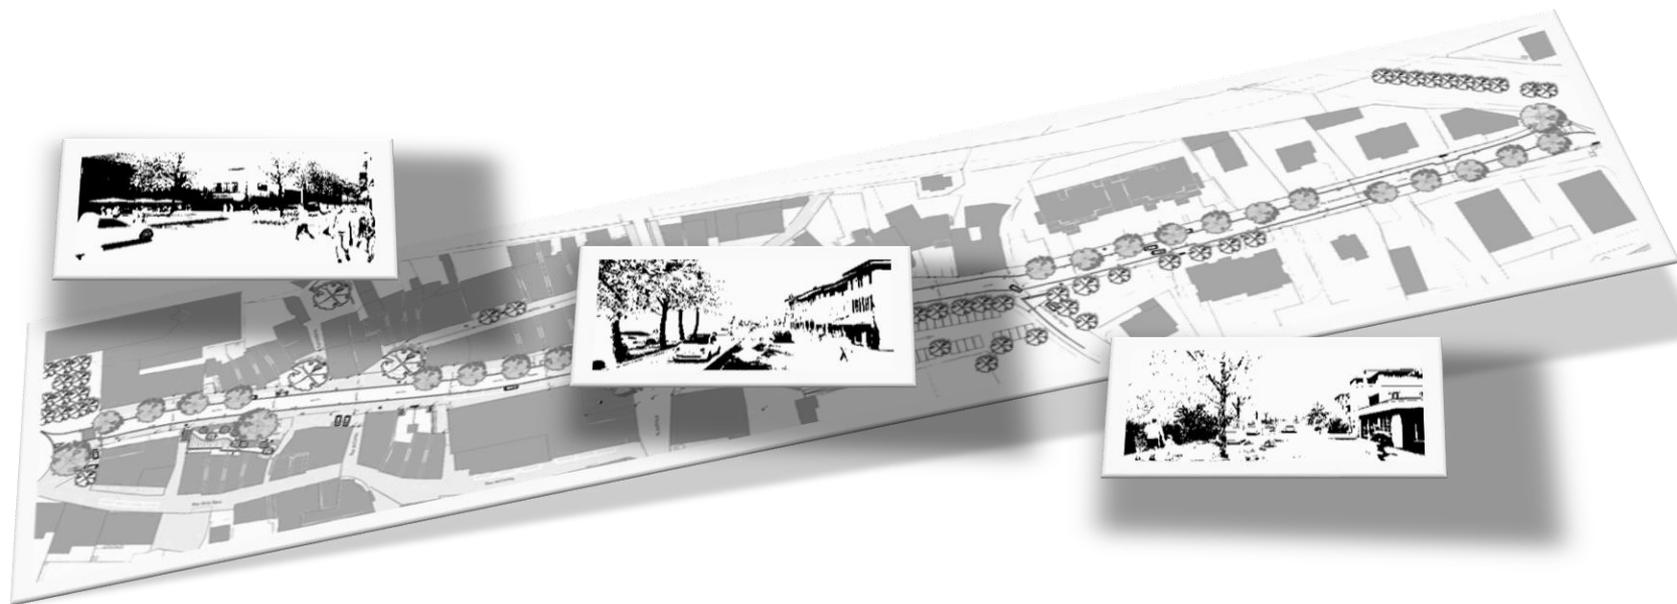



Réaménagement de l'espace public




Rue de la Poste





Réaménagement de l'espace public

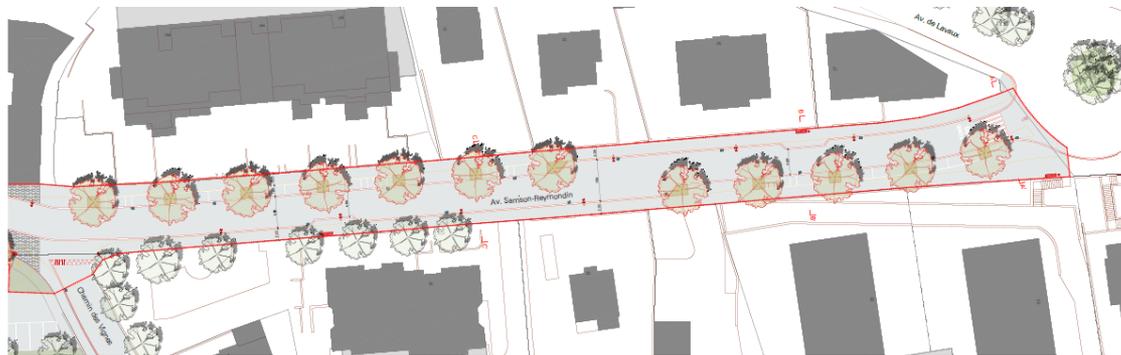


Av. Samson Reymondin






Renouvellement des infrastructures

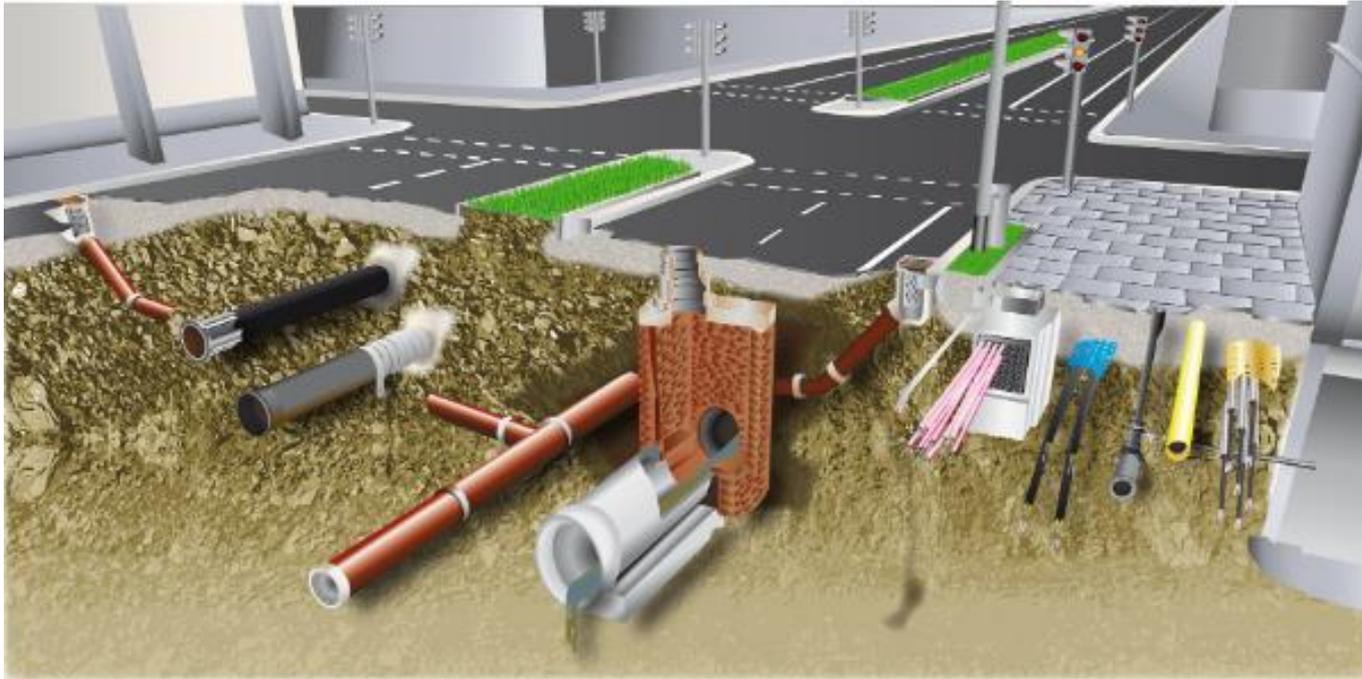




Renouvellement des infrastructures

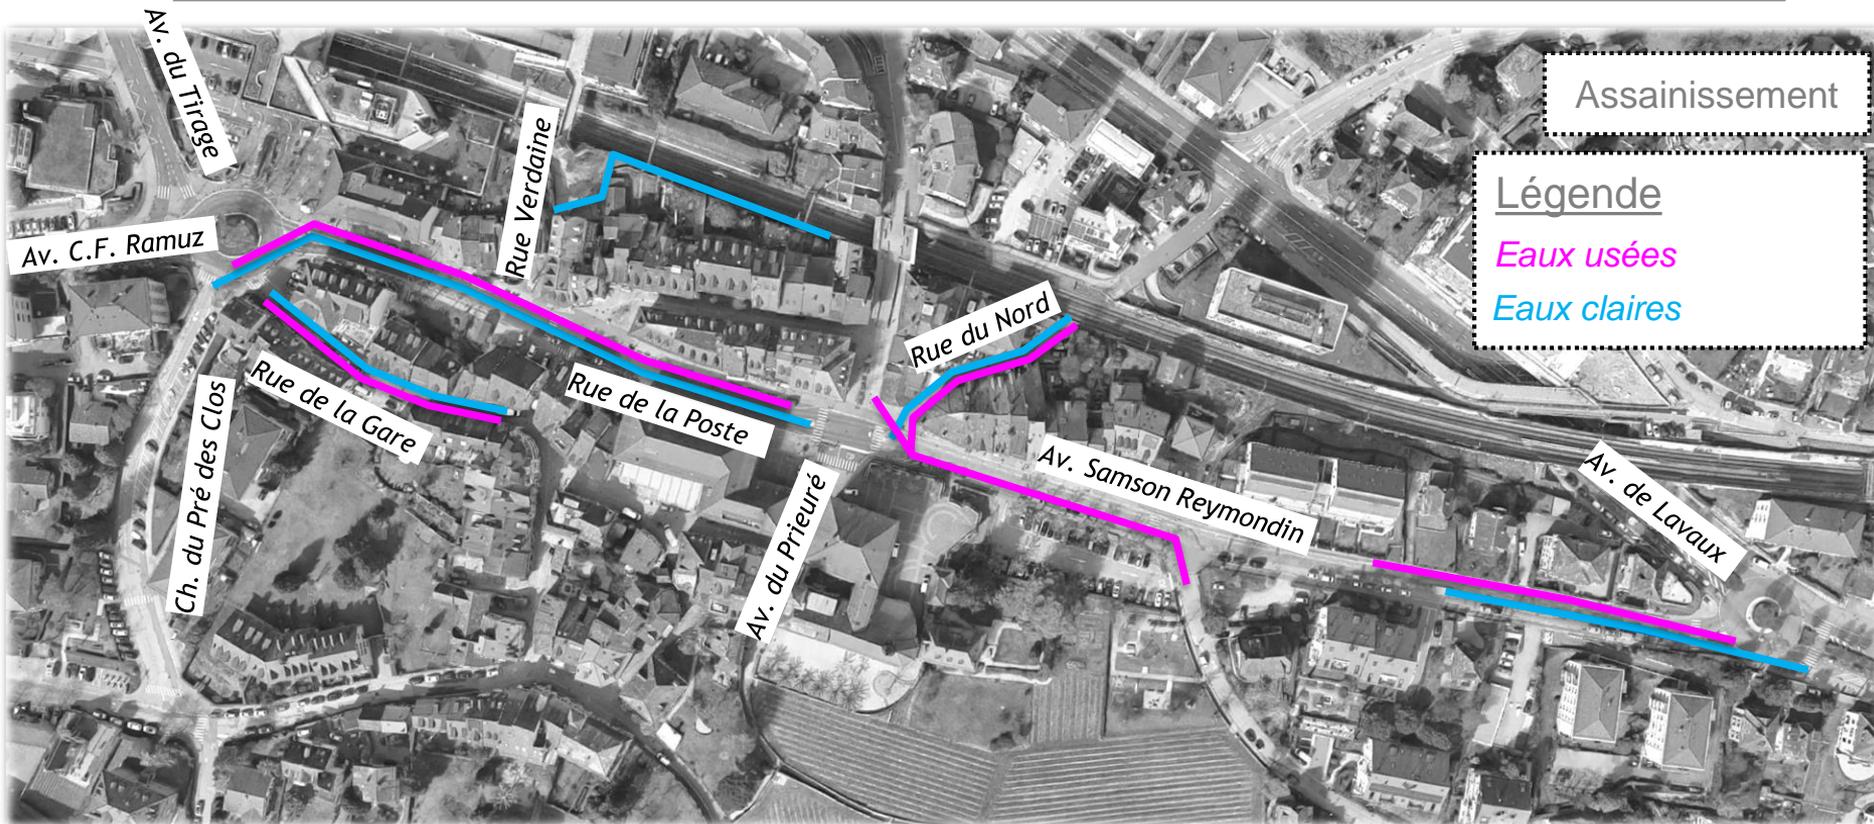




Renouvellement des infrastructures

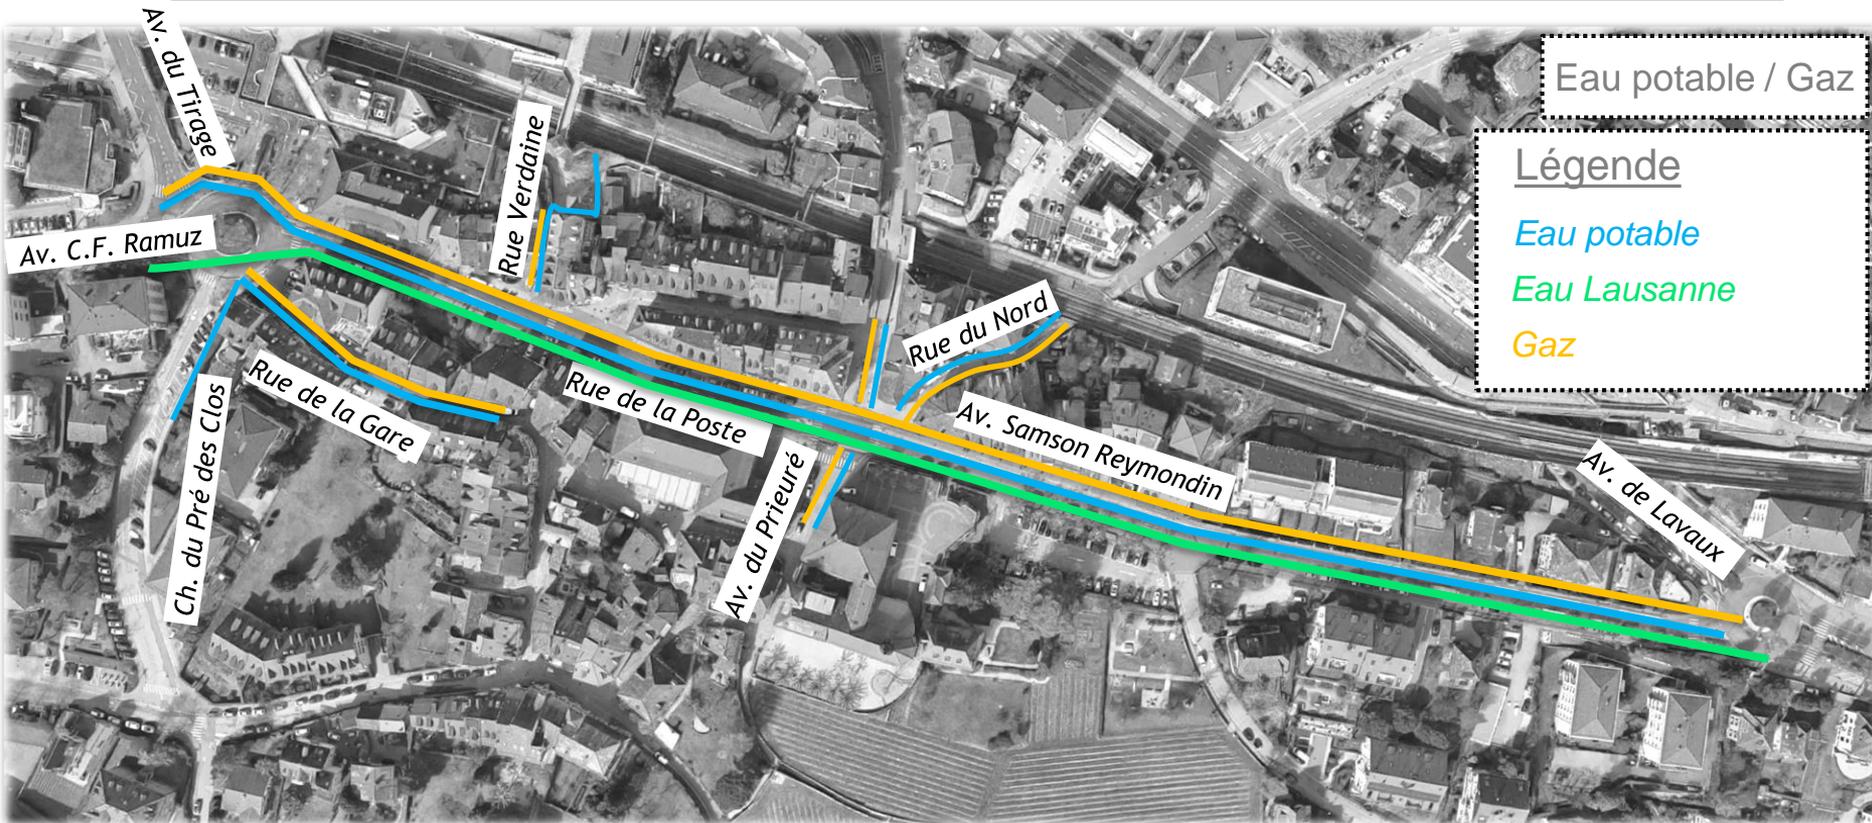




Renouvellement des infrastructures

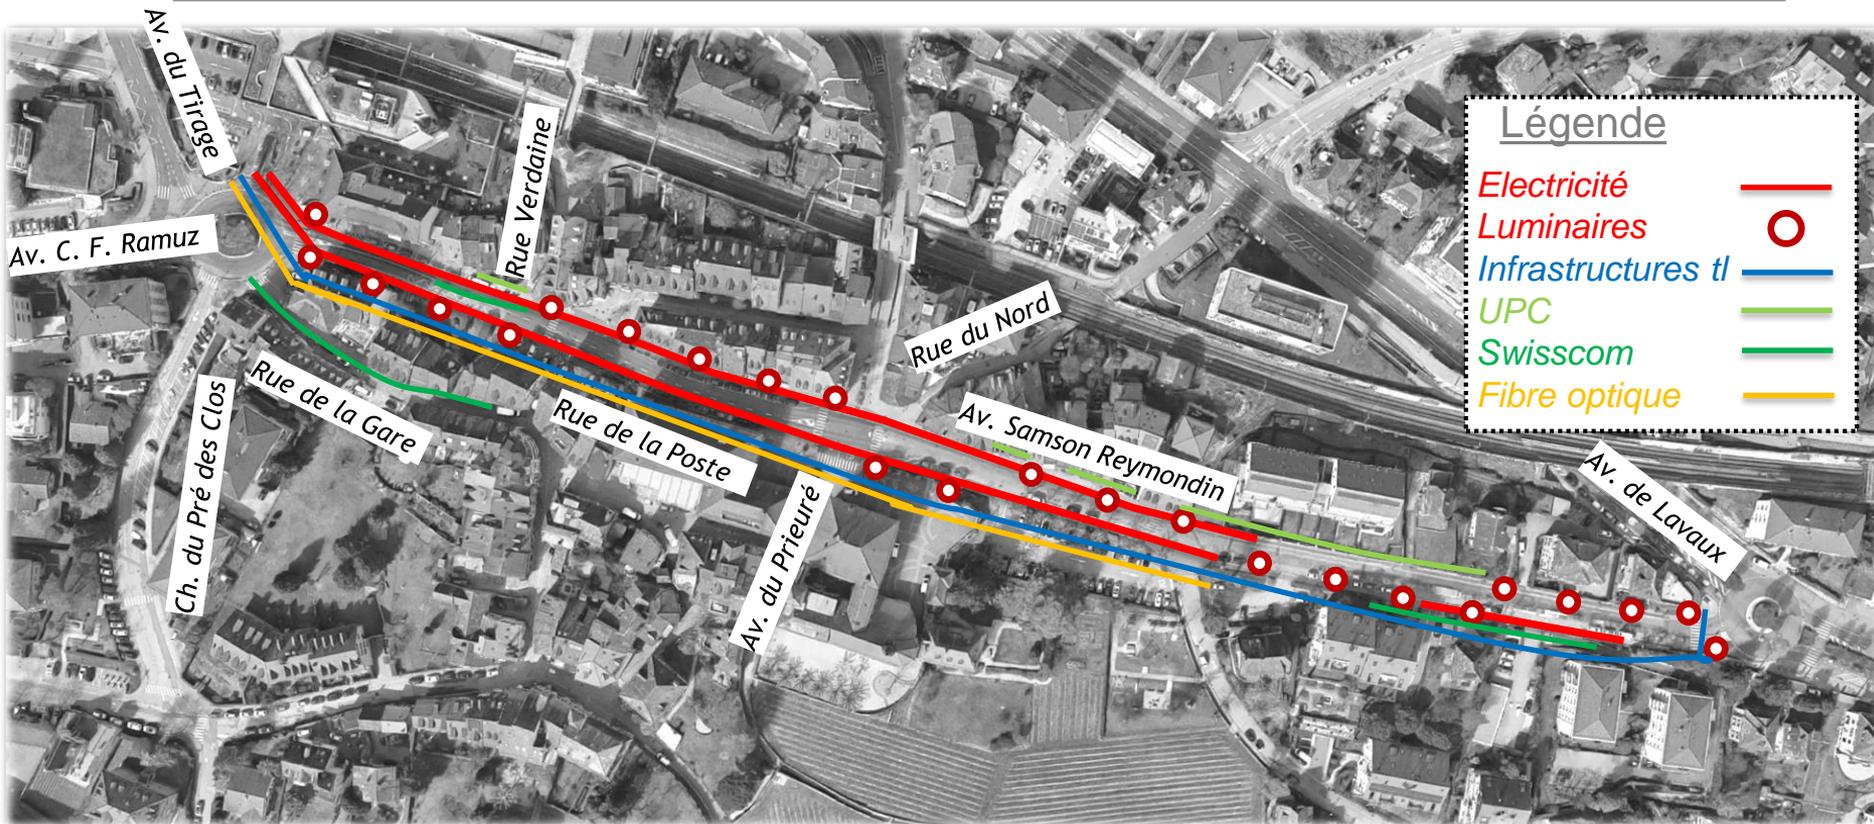



Organisation du chantier

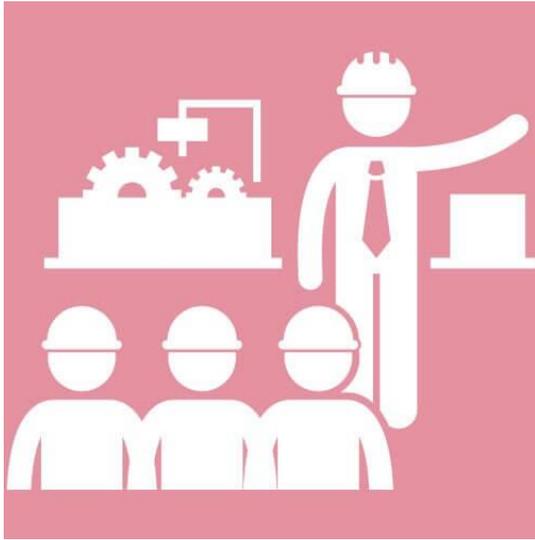



Défis à relever

Les objectifs à concilier :




- Assurer la sécurité des usagers.
- Réduire au maximum les inévitables nuisances d'un chantier en plein cœur de ville.
- Conserver une offre en stationnement raisonnable pour l'exploitation des commerces.
- Assurer la fluidité du trafic dans le centre-ville et en périphérie.
- Optimiser la durée des travaux.

La Municipalité a étudié plusieurs variantes de circulation en phase chantier et vous présente l'organisation qu'elle souhaite mettre en place.

Elle vous présente ce soir l'organisation du chantier pour recueillir d'éventuelles propositions qui pourraient, **dans la mesure du possible**, être prises en compte.



Planning des travaux

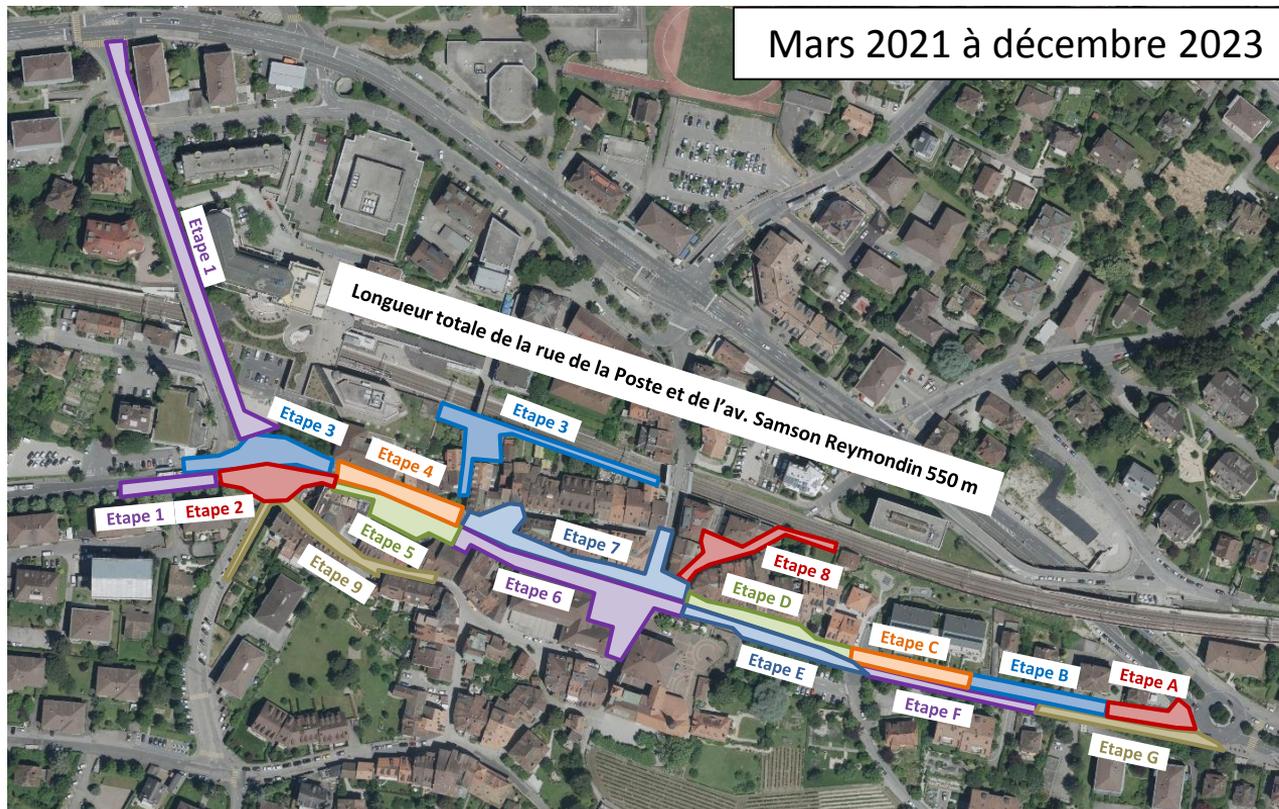

Rue de la Poste


- Etape 1** du 15 mars à mai 2021
- Etape 2** de mai à juillet 2021
- Etape 3** de juillet à octobre 2021
- Etape 4** de juillet 2021 à mai 2022
- Etape 5** de mai à août 2022
- Etape 6** de août 2022 à février 2023
- Etape 7** de février à juin 2023
- Etape 8** de juin à décembre 2023
- Etape 9** de juin à décembre 2023

Av. Samson Reymondin

- Etape A** de mai à juillet 2021
- Etape B** de juillet à octobre 2021
- Etape C** de juillet à octobre 2021
- Etape D** de octobre 2021 à mai 2022
- Etape E** de octobre 2021 à août 2022
- Etape F** de mai 2022 à février 2023
- Etape G** de août 2022 à février 2023



Incidence de la circulation en cas de sens unique

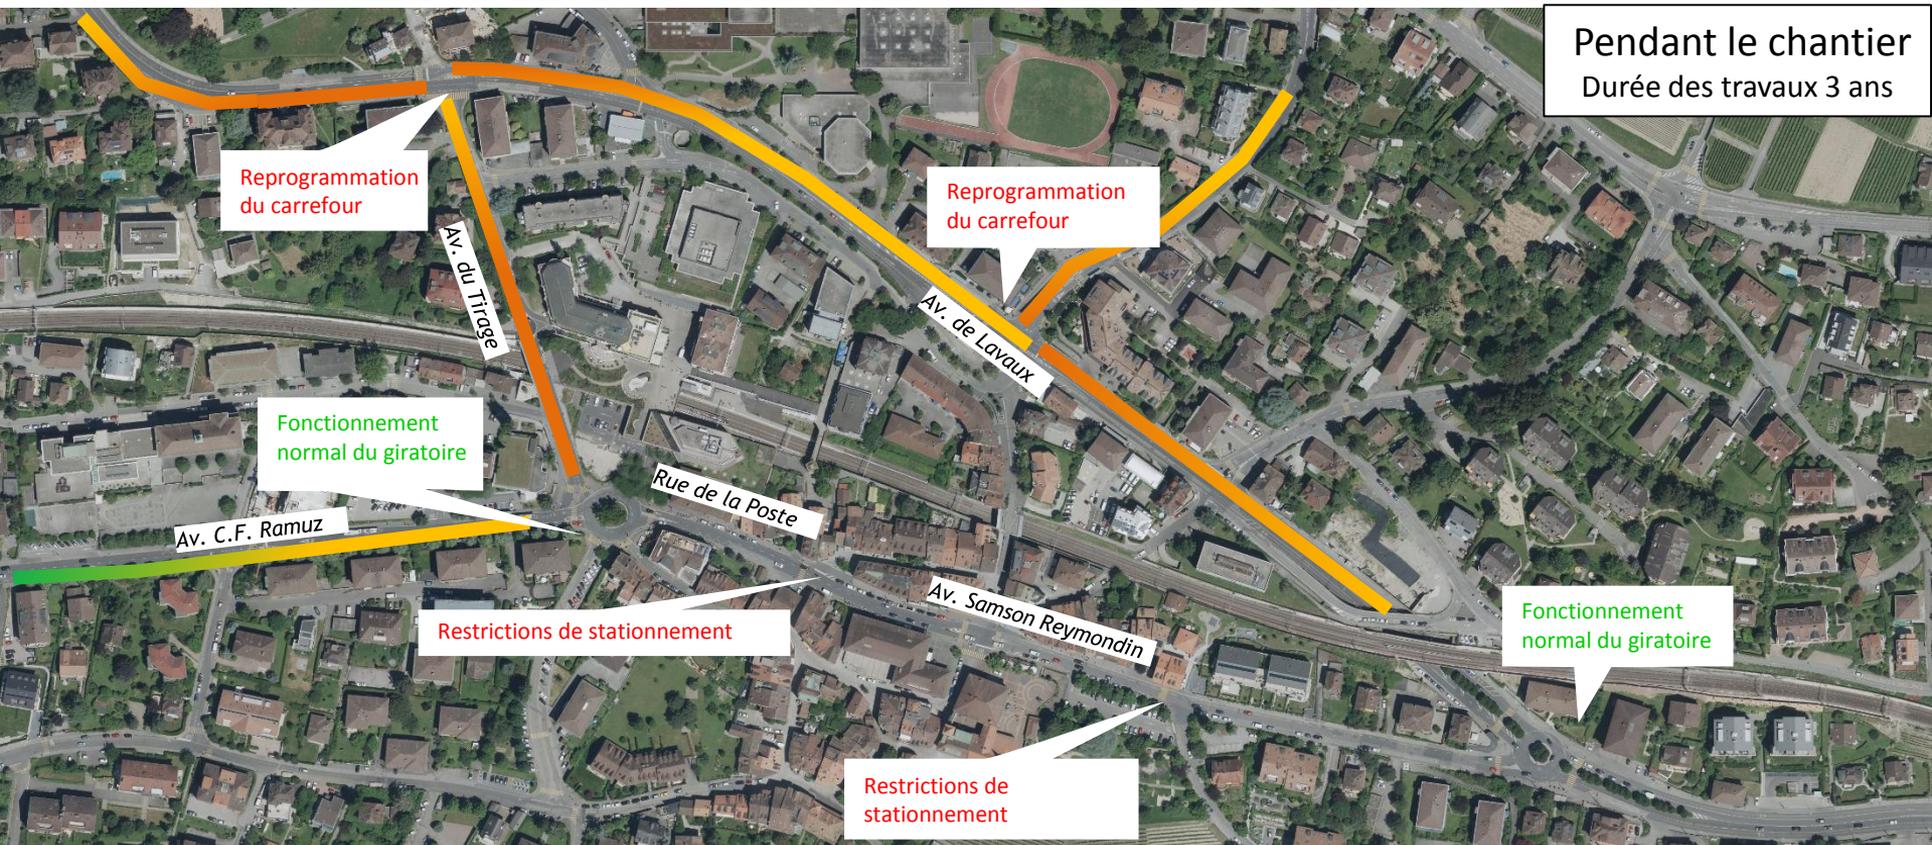

Pendant le chantier
Durée des travaux 3 ans

Reprogrammation
du carrefour

Reprogrammation
du carrefour

Fonctionnement
normal du giratoire

Fonctionnement
normal du giratoire

Restrictions de stationnement


Restrictions de
stationnement



Exemple de circulation pendant le chantier

Rue de la Poste, av. du Tirage et av. Samson Reymondin

Etape 1 : du 15 mars à mai 2021

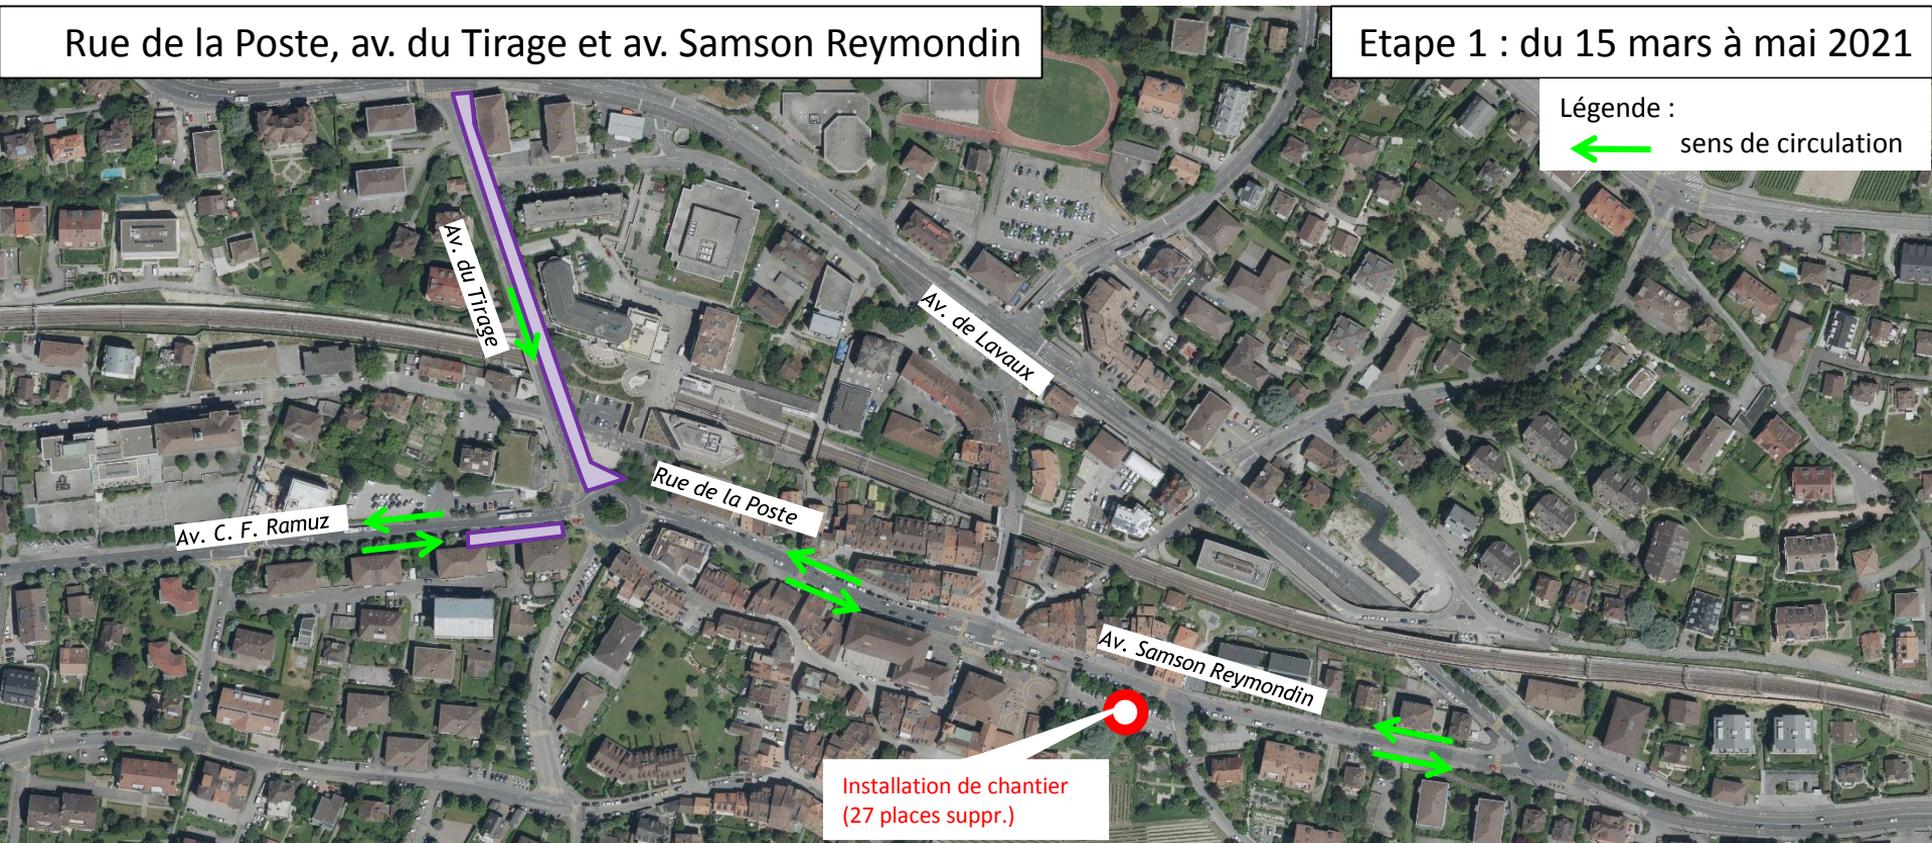




Exemple de circulation pendant le chantier

Rue de la Poste, av. du Tirage et av. Samson Reymondin

Etapes 2 et A : de mai à juillet 2021

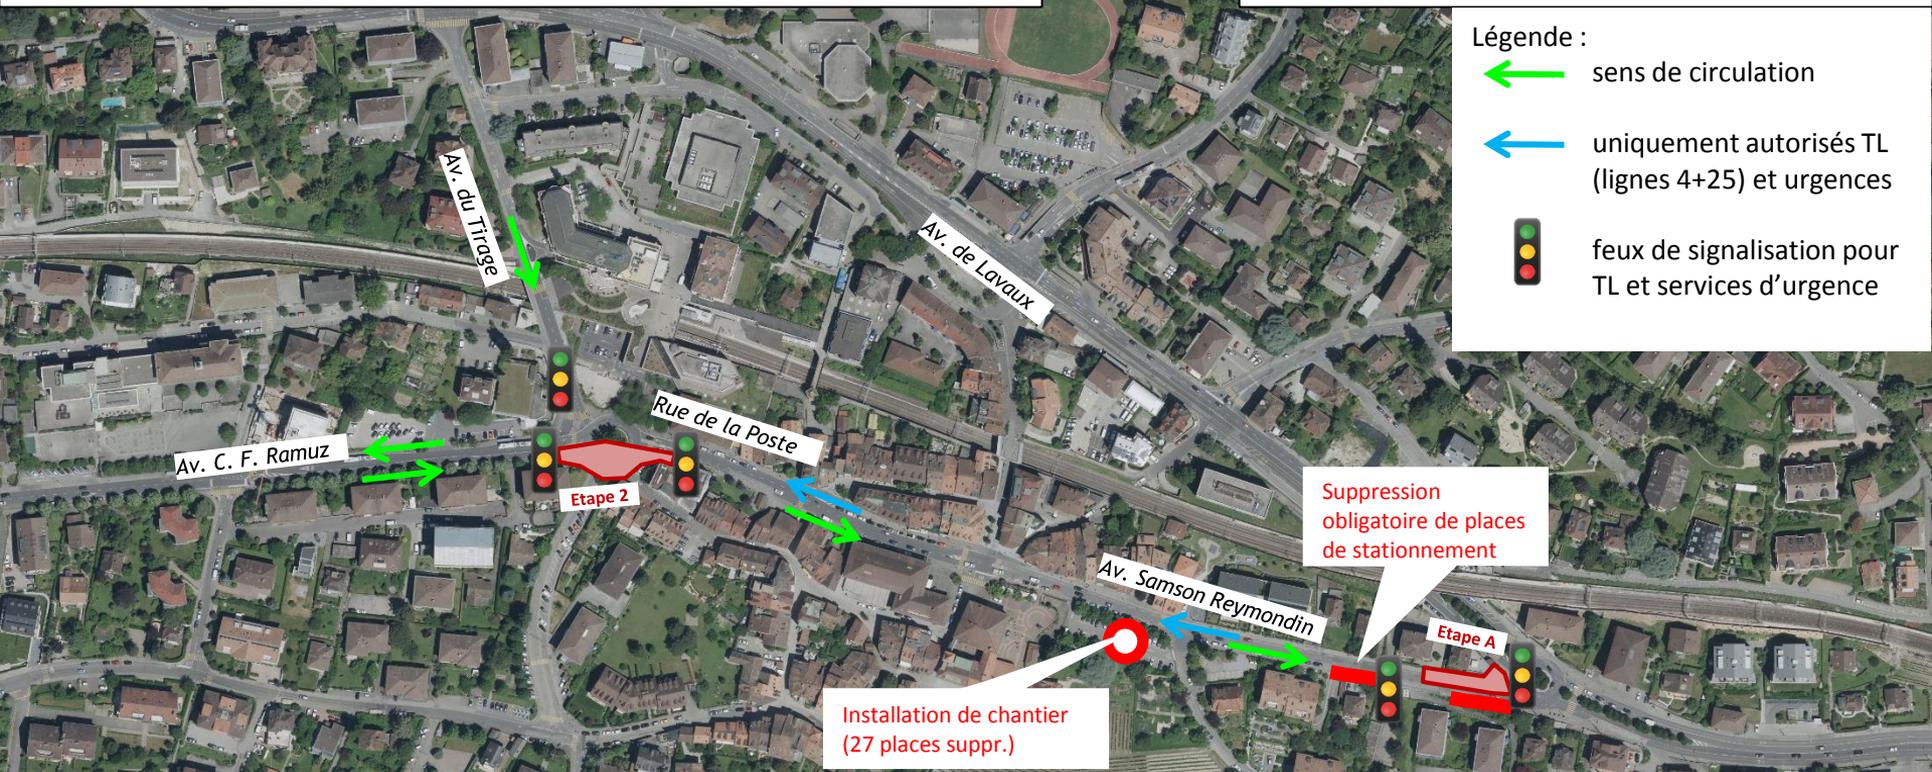

Légende :

-  sens de circulation
-  uniquement autorisés TL (lignes 4+25) et urgences
-  feux de signalisation pour TL et services d'urgence



Circulation pendant le chantier


Av. Samson Reymondin

Etapes B et C - de juillet à décembre 2021

Légende :



sens de circulation

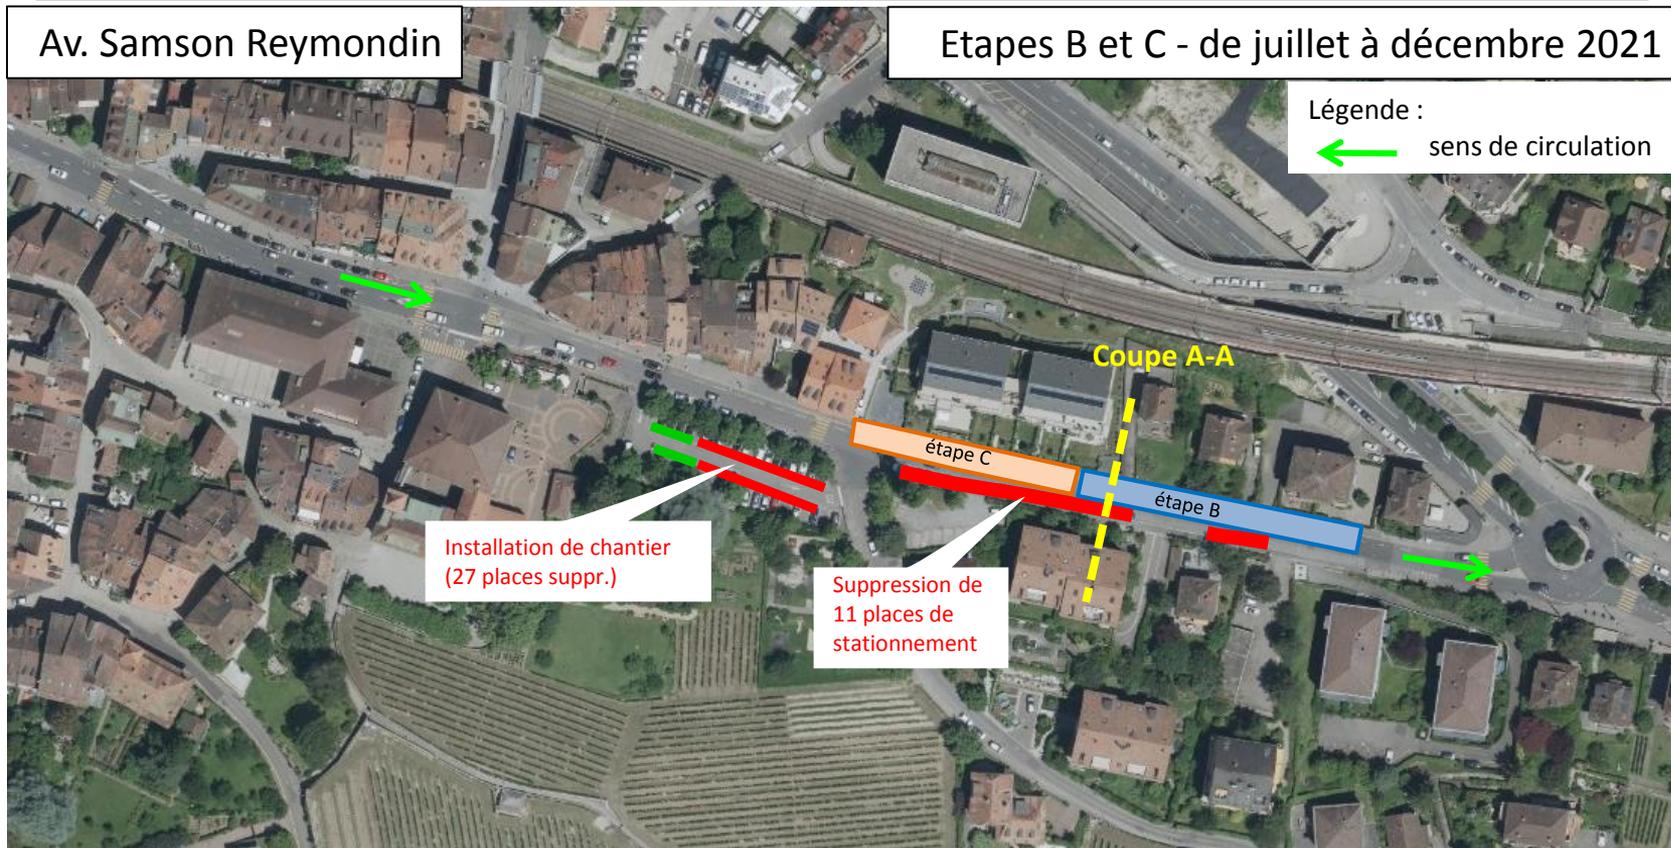




Circulation pendant le chantier – coupe A-A

Zone de travaux - étapes B + C

Av. Samson Reymondin - gabarit de circulation

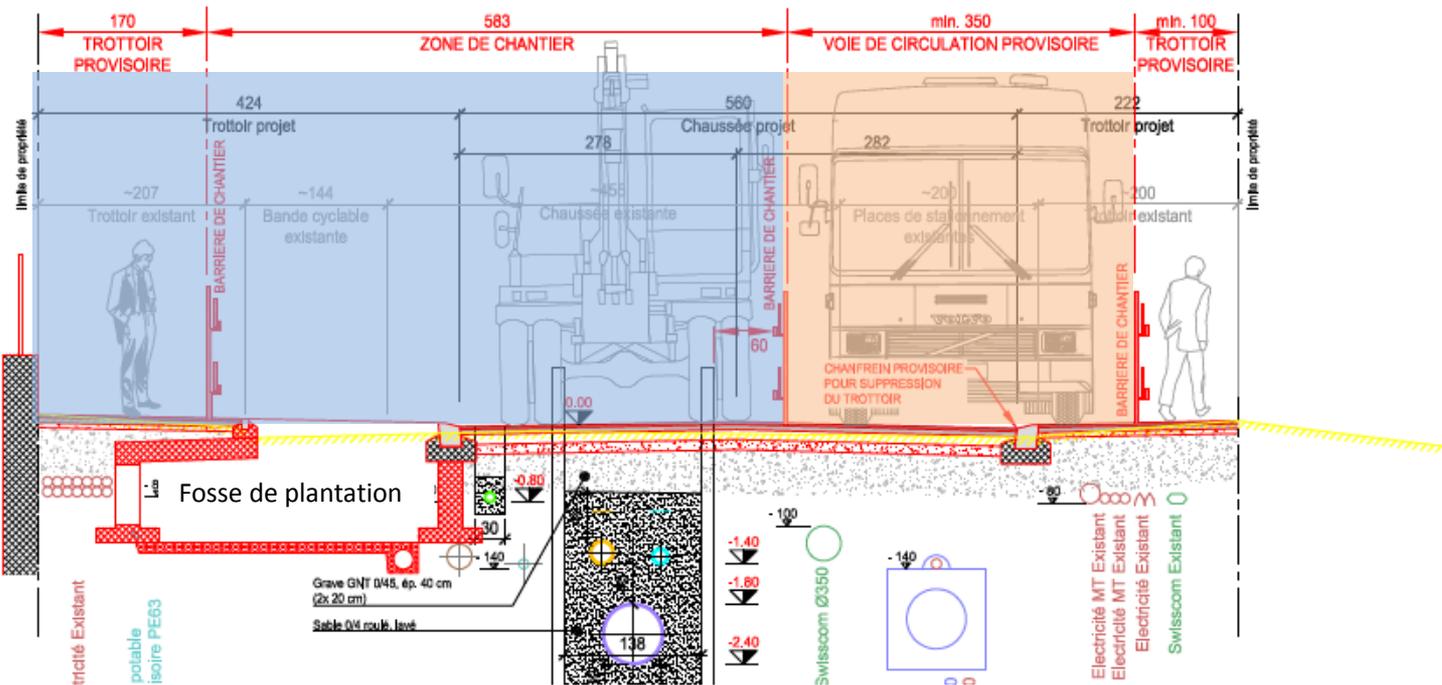




Circulation pendant le chantier

Rue de la Poste

Étapes 5 et 6 - de mai 2022 à février 2023

Légende :

 sens de circulation

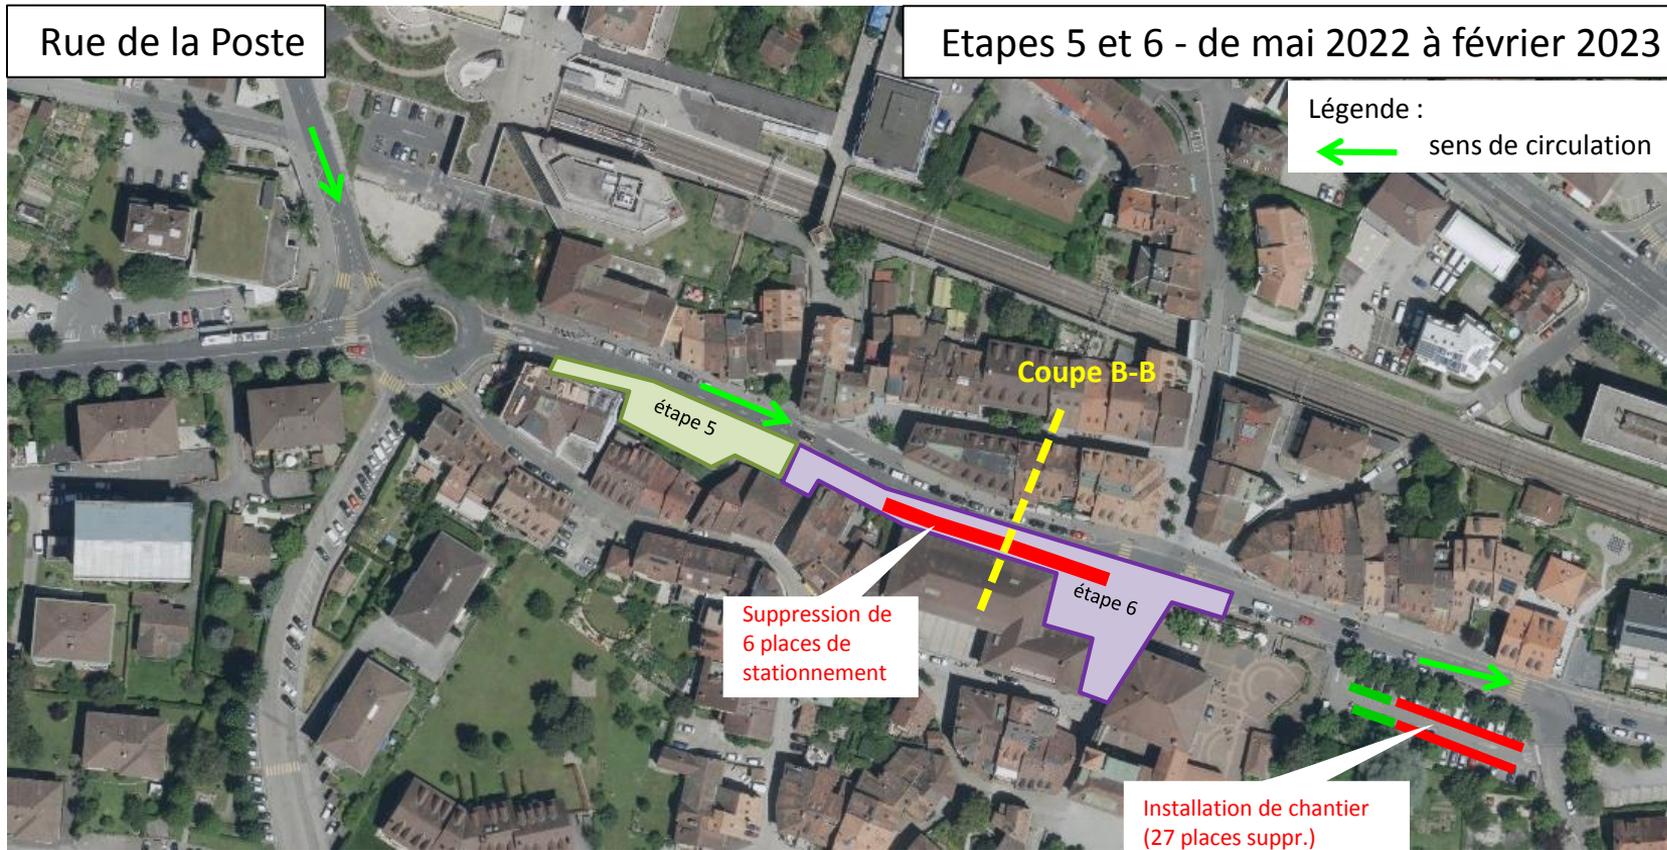




Circulation pendant le chantier – coupe B-B


Rue de la Poste - gabarit de circulation

Zone de travaux - étapes 5 + 6

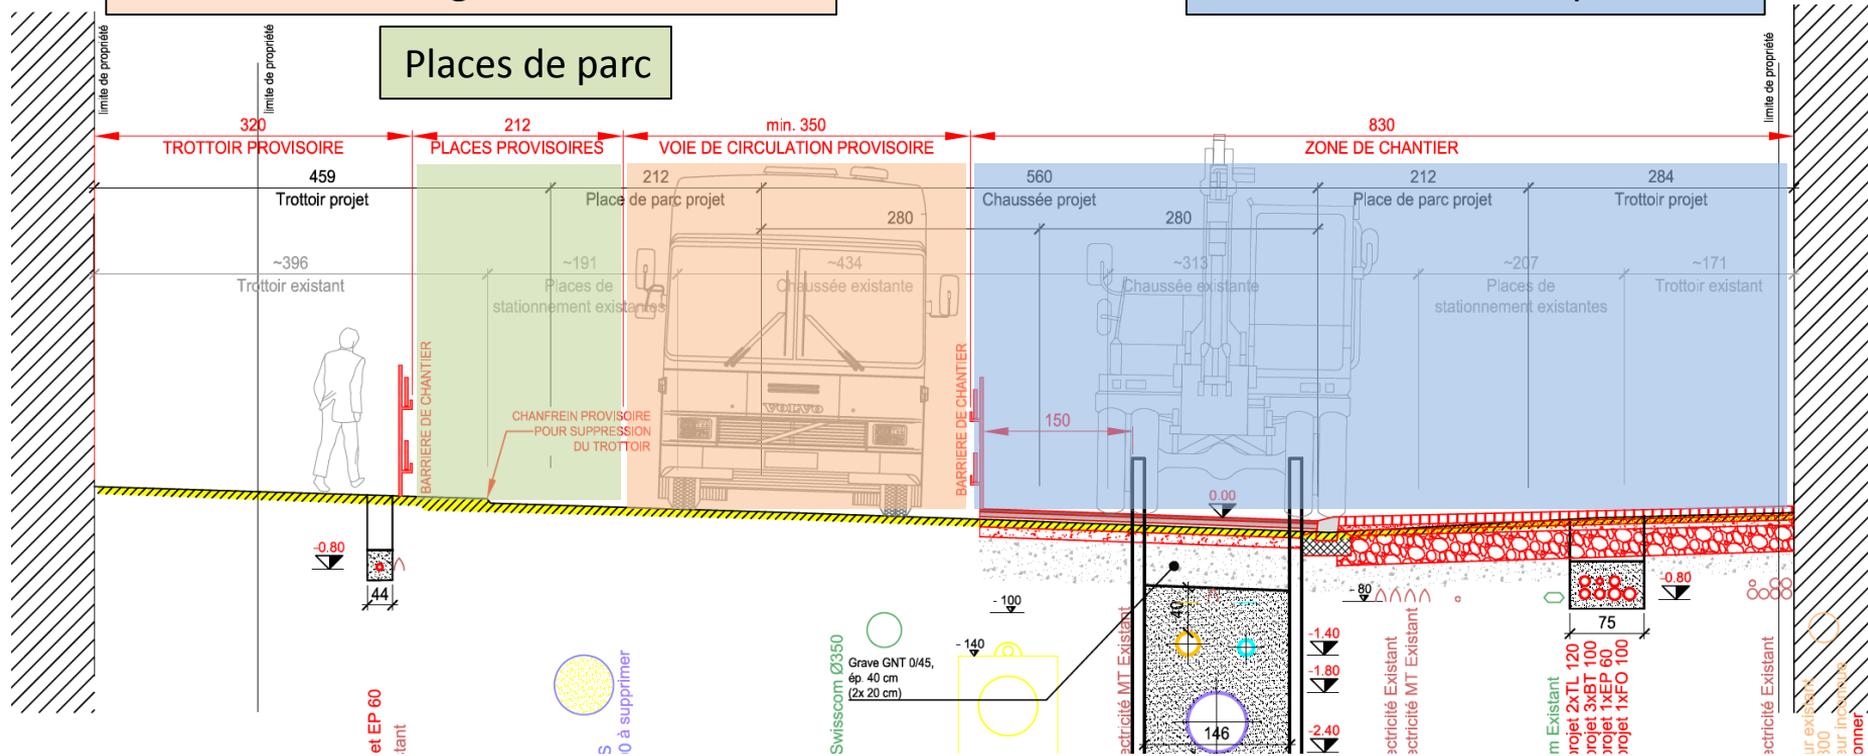




Incidence de la circulation à double sens

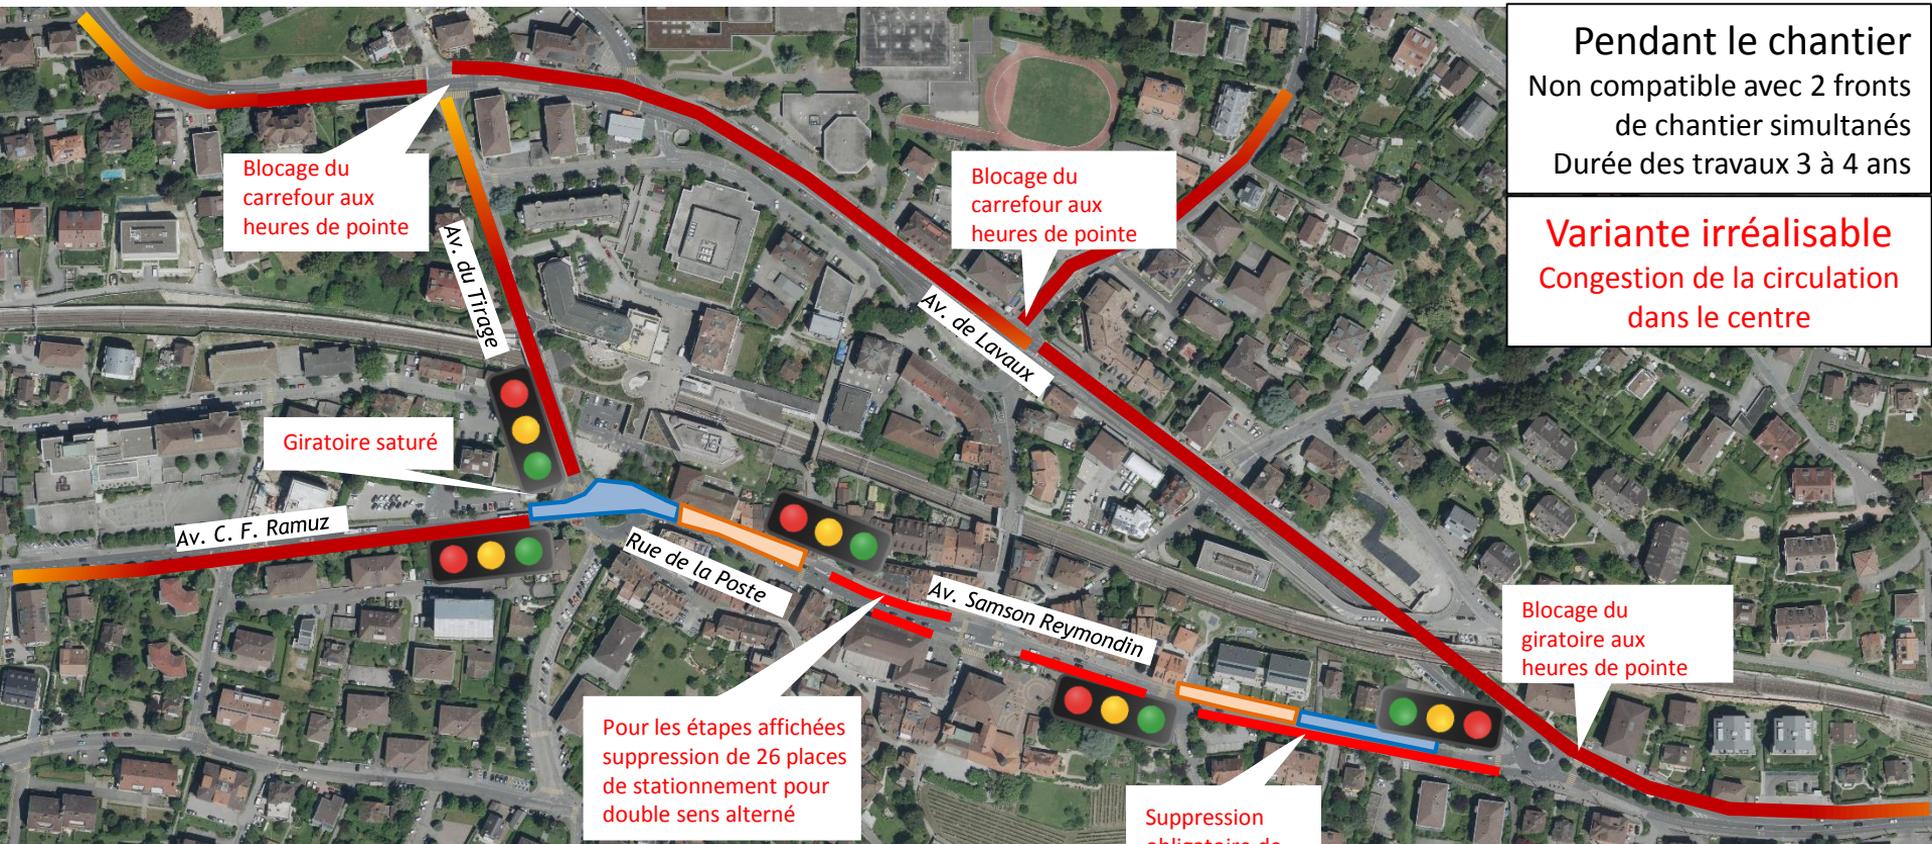



Incidence de la circulation à double sens

Profil journalier horaire par direction, moyenne des 5 semaines les plus chargées

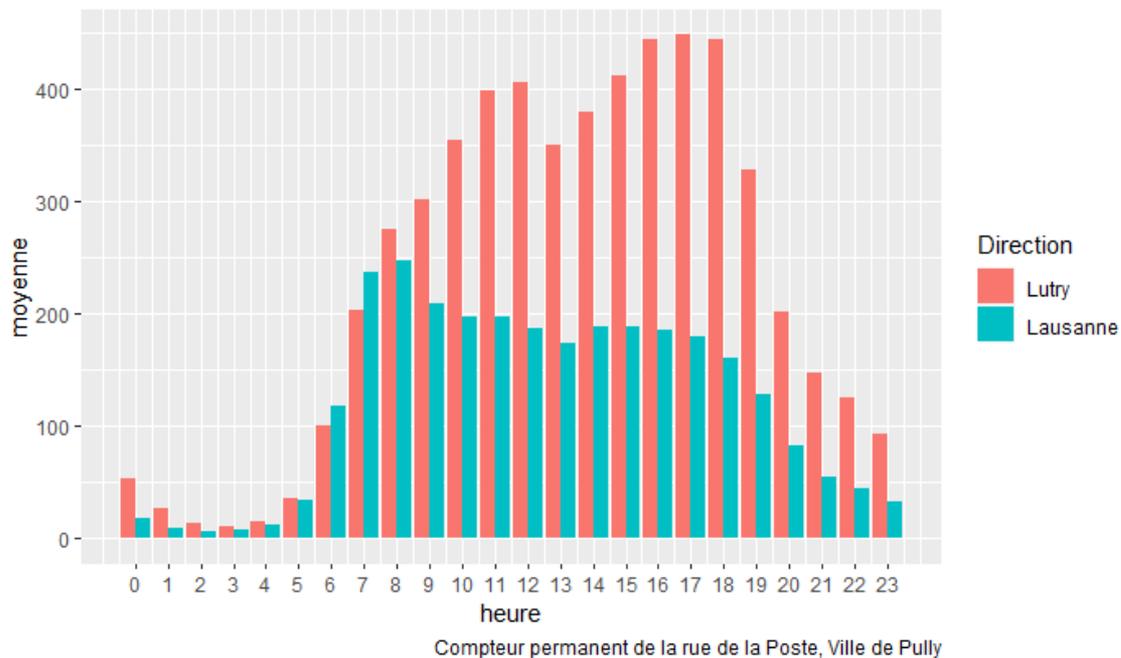


Giratoire Reymondin

La faible capacité d'écoulement des véhicules sortant de l'av. S. Reymondin sur l'av. de Lavaux aux heures de pointe du soir ne permet pas d'installer une circulation alternée sur ce tronçon.



Incidence de la circulation à double sens

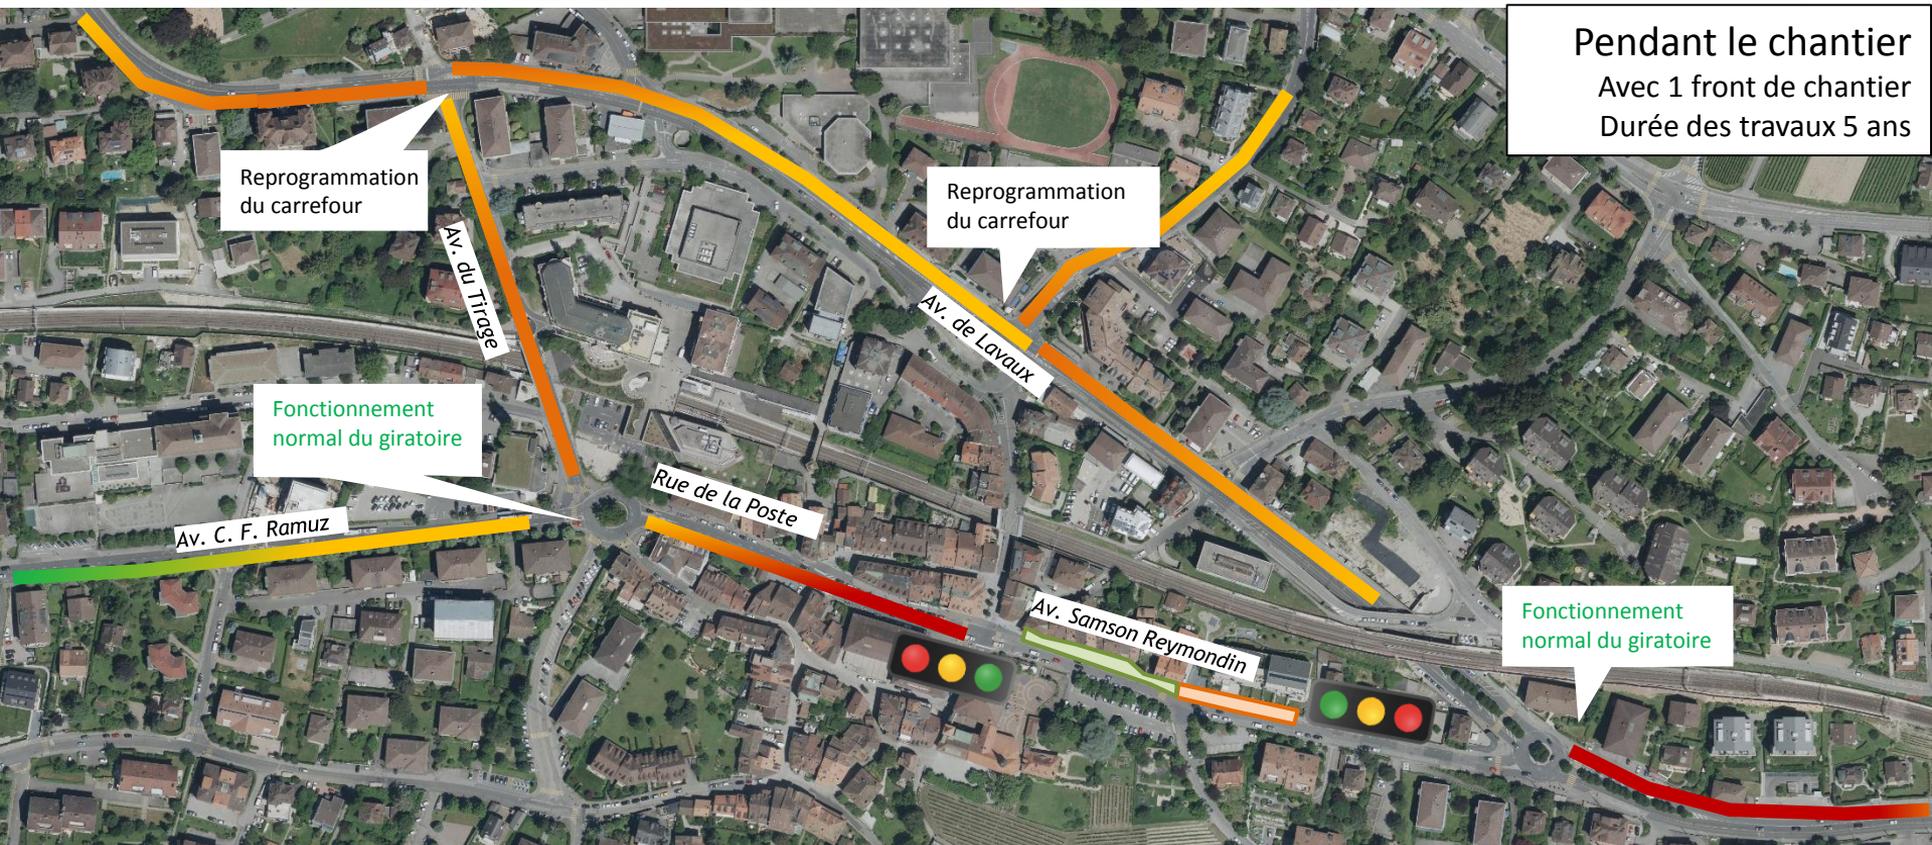

Reprogrammation
du carrefour

Av. du Tirage

Fonctionnement
normal du giratoire

Av. C. F. Ramuz

Rue de la Poste

Reprogrammation
du carrefour

Av. de Lavoux


Av. Samson Reymondin

Fonctionnement
normal du giratoire

Pendant le chantier
Avec 1 front de chantier
Durée des travaux 5 ans



Stationnement

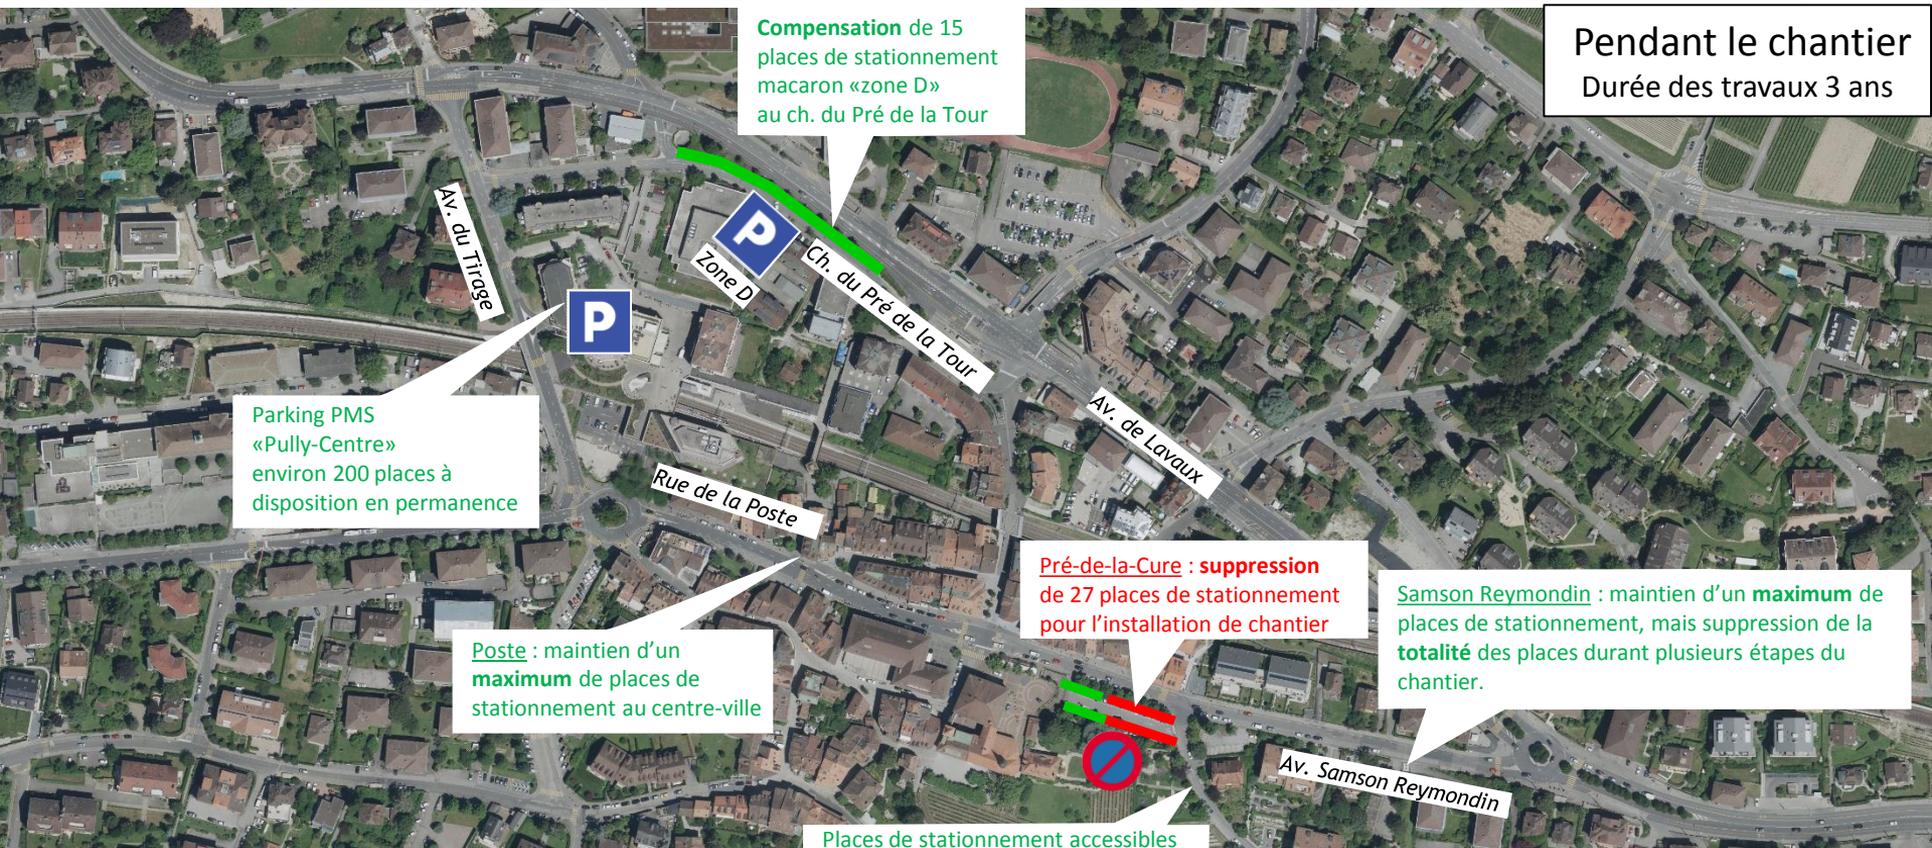

Compensation de 15 places de stationnement macaron «zone D» au ch. du Pré de la Tour

Pendant le chantier
Durée des travaux 3 ans

Parking PMS «Pully-Centre» environ 200 places à disposition en permanence

Poste : maintien d'un maximum de places de stationnement au centre-ville

Pré-de-la-Cure : suppression de 27 places de stationnement pour l'installation de chantier

Samson Reymondin : maintien d'un maximum de places de stationnement, mais suppression de la totalité des places durant plusieurs étapes du chantier.

Places de stationnement accessibles au ch. des Vignes à partir du mois de décembre 2021



Analyse des variantes



- **Circulation en sens unique**

- travaux par étapes simultanées
- maintien d'un maximum de places de parc
- durée 3 ans

Variante privilégiée

- En concertation avec les commerçants, mise en place d'une signalisation afin de faciliter l'accès aux commerces



Analyse des variantes



- **Circulation en double sens alterné**
 - travaux par étapes simultanées
 - suppression de la quasi-totalité des places de stationnement et blocage de la circulation sur les axes principaux du centre-ville
 - **irréalisable**
- **Circulation en double sens alterné lors de certaines étapes**
 - travaux avec un seul front de chantier
 - blocage inévitable du trafic sur certaines étapes
 - durée 5 ans



Discussion et questions



Merci de votre attention



Renseignements : Régis Brasey
Ch. de la Damataire 13
☎ 021 721 31 11
✉ regis.brasey@pully.ch
